



FLS. 02  
528/2017  
Protocolo

# Plano de **OBRAS**

**2018-2021**



PREFEITURA  
DE DIADEMA  
*Compromisso e Gestão*

FLS. 03  
528/2017  
Protocolo ✓

## Ficha Técnica

Prefeito  
Lauro Michels

Vice-Prefeito  
Márcio da Giudicio

Secretaria de  
**Comunicação**  
Carla Dualib

Secretaria de  
**Planejamento  
e Gestão Pública**

Francisco José Rocha

Secretaria de  
**Serviços e Obras**

José Marcelo Ferreira Marques

Secretaria de  
**Defesa Social**

Marcel Lacerda Soffner

Secretaria de  
**Habitação e  
Desenvolvimento Urbano**

Regina Gonçalves

Secretaria de  
**Educação**

Tatiane Ramos

Secretaria de  
**Assistência Social  
e Cidadania**

Caroline Rocha

Secretaria de  
**Esporte e Lazer**  
Paulo Henrique Ferreira

Secretaria de  
**Saúde**

Luis Cláudio Sartori

Secretaria de  
**Transportes**  
José Carlos Gonçalves

Secretaria de  
**Meio Ambiente**  
Tatiana Capel



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

Gabinete do Prefeito

A(S) COMISSÃO(ÕES) DE:.....

Diadema, 29 de setembro de 2017.

OF. ML n.º 37/2017

DATA 05 / 10 / 2017

Excelentíssimo Senhor Presidente,

*[Handwritten signature]*  
PRESIDENTE

Temos a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e de seus ilustres pares que compõe essa Colenda Câmara, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano de Obras para o exercício de 2018.

O Plano de Obras que ora apresentamos, reflete as principais demandas das áreas sociais do Município, como moradia, obras nas áreas da saúde, educação, assistência social, cultura e esportes e obras de intervenção no sistema viário, favorecendo a mobilidade urbana, área de saneamento, dentre outras.

Através do respectivo Anexo, integrante deste projeto de lei, está detalhado o montante com recursos vinculados, provenientes de emendas parlamentares do Orçamento Geral da União (OGU), Plano de Aceleração do Crescimento nas áreas de Habitação e Saneamento, emendas Estaduais, operações de crédito em andamento e outros projetos voluntários apresentados junto aos diversos Ministérios.

Foram adequadas as contrapartidas com recursos próprios de acordo com o cronograma físico-financeiro de cada projeto.

Nesse sentido, aguarda este Executivo, venha essa Colenda Câmara acolher e aprovar o incluso Projeto de Lei, nos termos que preceitua o artigo 52, da Lei Orgânica do Município.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência e dignos pares, os protestos de elevada estima e especial consideração.

Atenciosamente.

*[Handwritten signature]*  
**LAURO MICHELS SOBRINHO**

Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor

**Vereador ANTONIO MARCOS ZAROS MICHELS**

DD. Presidente da Câmara Municipal de  
DIADEMA – SP

DESPACHO DO EXMO. SR. PRESIDENTE: *Enc.a*

*SAJUL para encaminhamento*

DATA 29 / 09 / 2017

*[Handwritten signature]*  
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE DIADEMA

29-SET-2017 15:51 002047 12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

PROJETO DE LEI Nº 37, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017

**DISPÕE** sobre a aprovação do Plano de Obras do Município de Diadema para o exercício de 2.018, e dá outras providências.

**LAURO MICHELS SOBRINHO** Prefeito do Município de Diadema, Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais,

**FAZ SABER** que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Fica aprovado o **Plano de Obras** do Município de Diadema para o exercício de 2.018, nos termos do art. 116 da Lei Orgânica do Município, no valor de R\$ 40.055.000,00 (Quarenta Milhões, Cinquenta e Cinco Mil Reais) em conformidade com o Anexo, integrante desta Lei.

**Paragrafo único:** O referido anexo ficará disponível no portal da transparência do Município de Diadema.

**Art. 2º** - Os valores constantes do **Plano de Obras** guardarão perfeita correspondência com os respectivos créditos orçamentários consignados no Orçamento-Programa para o exercício 2.018.

**Art. 3º** - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2018.

Diadema, 29 de setembro 2017.

  
**LAURO MICHELS SOBRINHO**  
Prefeito Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

FLS. 05-A

528/2017

Protocolo

PLANO DE OBRAS - EXERCÍCIO 2018						
Programa	Secretarias	Ação	Etapa	Descrição (por etapa)	Fonte de Recurso	Elemento Despesa
11	ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	1007	1	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO	15000422	449051
					25001416	449051
					R\$ 400.000,00	
SUB-TOTAL ( SECRETARIA )						
17	DEFESA SOCIAL	1029	1	REFORMA DO VELÓRIO	11000436	449051
					21000436	449051
SUB-TOTAL ( SECRETARIA )						
19	EDUCAÇÃO	1048	1	CONSTRUÇÃO CRECHE SAGRADO CORAÇÃO	12100371	449051
					52100371	449051
		2	CONSTRUÇÃO CRECHE IRMÃ DULCE	12100371	449051	
				52100371	449051	
SUB-TOTAL ( SECRETARIA )						
08	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	1020	1	PAC CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	31000311	339039
					51000367	449039
					51000367	449051
		1021	1	COMPLEXO BEIRA RIO	31000311	339039
					51002353	449039
					51002353	449051
		1022	1	COMPLEXO NAVAL - KRONES / PIRAPORINHA	31000311	449051
					51000346	449051
					31000311	449051
		1023	1	COMPLEXO SANTA ELIZABETH	31000311	449051
					51001353	449051
		1024	1	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	31000311	339039
					51000342	449039
		1025	1	URBANIZAÇÃO MANANCIAL - NÚCLEOS IGUASSU/CAVIUNA/SITIO JOANINHA	31000311	339039
					31000311	449051
51000349	449051					
SUB-TOTAL ( SECRETARIA )						
					R\$ 100.000,00	
					R\$ 300.000,00	
					R\$ 400.000,00	
					R\$ 21.000,00	
					R\$ 150.000,00	
					R\$ 171.000,00	
					R\$ 876.000,00	
					R\$ 1.136.000,00	
					R\$ 805.000,00	
					R\$ 767.000,00	
					R\$ 3.584.000,00	
					R\$ 100.000,00	
					R\$ 860.000,00	
					R\$ 5.916.000,00	
					R\$ 34.000,00	
					R\$ 240.000,00	
					R\$ 3.500.000,00	
					R\$ 700.000,00	
					R\$ 2.115.000,00	
					R\$ 8.000.000,00	
					R\$ 1.000.000,00	
					R\$ 2.500.000,00	
					R\$ 130.000,00	
					R\$ 200.000,00	
					R\$ 1.000.000,00	
					R\$ 10.700.000,00	
					R\$ 12.295.000,00	

\* Os Superávits abaixo serão lançados durante a execução orçamentária do ano de 2018.

Superávit Financeiro Estimado



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

FLS. 05-B  
528/2017  
Protocolo

PLANO DE OBRAS - EXERCÍCIO 2018							* Os Superávits abaixo serão lançados durante a execução orçamentária do ano de 2018.	
Programa	Secretarias	Ação	Etapa	Descrição (por etapa)	Fonte de Recurso	Elemento Despesa	Exercício 2018	Superávit Financeiro Estimado
03	ESPORTE E LAZER	1030	1	REFORMA DA QUADRA DA VILA NOGUEIRA	11000435	449051	R\$ 61.000,00	
		1031	1	REFORMA DO CAMPO ALBATROZ	51000435	449051	R\$ 244.000,00	
		1032	1	REFORMA DO CAMPO ELTORADO	11000434	449051	R\$ 195.000,00	
<b>SUB-TOTAL ( SECRETARIA )</b>					51000433	449051	R\$ 278.000,00	
<b>SUB-TOTAL ( SECRETARIA )</b>							R\$ 1.815.000,00	
13	SAÚDE	1034	1	IMPLANT. DO CENTRO LUCY MONTORO	23005260	449051	R\$ 3.900.000,00	
		1035	1	CONSTRUÇÃO DE CAPS INFANTIL	53005374	449051	R\$ 1.150.000,00	
		1036	1	CONSTRUÇÃO DE CAPS AD	13005374	449051	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
		1038	1	CONSTRUÇÃO DO CAPS III	13006374	449051	R\$ 150.000,00	
		1040	1	CONSTR. DO PAI - UNID. PRONTO ATEND.INFANTIL	53006374	449051	R\$ 1.250.000,00	
		1043	1	CONSTRUÇÃO DA UBS VILA PAULINA	53006374	449051	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
<b>SUB-TOTAL ( SECRETARIA )</b>					13007374	449051	R\$ 150.000,00	
<b>SUB-TOTAL ( SECRETARIA )</b>					53007374	449051	R\$ 1.250.000,00	
<b>SUB-TOTAL ( SECRETARIA )</b>					53007374	449051	R\$ 50.000,00	
<b>SUB-TOTAL ( SECRETARIA )</b>					13100000	449051	R\$ 750.000,00	
<b>SUB-TOTAL ( SECRETARIA )</b>					13100000	449051	R\$ 500.000,00	
<b>SUB-TOTAL ( SECRETARIA )</b>							R\$ 9.250.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

FLS. 05-C  
528/2017  
Protocolo

PLANO DE OBRAS - EXERCÍCIO 2018										
Programa	Secretarias	Ação	Etapa	Descrição (por etapa)	Fonte de Recurso	Elemento Despesa	Exercício 2018	* Os Superávits abaixo serão lançados durante a execução orçamentária do ano de 2018.		
								Superávit Financeiro Estimado		
		1015	1	VIDA LIMPA - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE TRIAGEM CHICO MENDES	11003400	449051	R\$ 71.000,00			
					71003400	449051	R\$ 1.863.000,00			
					71004377	449051	R\$ 672.000,00			
		1015	2	VIDA LIMPA - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL GERAL DE PROCESSAMENTO DO JD INAMAR	11003400	449051	R\$ 40.000,00			
					71003400	449051	R\$ 400.000,00			
		1017	1	CANALIZAÇÃO DOS CÓRREGOS (GROTA FUNDA)	11000366	449051	R\$ 800.000,00			
					11100000	449061	R\$ 150.000,00			
					51000366	449051	R\$ 4.212.000,00			
		1017	2	CANALIZAÇÃO DOS CÓRREGOS (OLARIA)	11000366	449051	R\$ 450.000,00			
					11100000	449061	R\$ 750.000,00			
		1017	3	CANALIZAÇÃO RUA DO MAR	11000366	449051	R\$ 50.000,00			
					51000366	449051	R\$ 550.000,00			
		1037	1	REFORMA DO PARQUE ECOLÓGICO ELDORADO	11000431	449051	R\$ 56.000,00			
					51000431	449051	R\$ 244.000,00			
		1046	5	IMPLANTAÇÃO DE TRATAMENTO PREFERENCIAL PARA TRANSPORTE COLETIVO NA RUA RIO DE JANEIRO E AV. CASA GRANDE	11100000	449061	R\$ 1.247.000,00			
		1047	1	REFORMA DA PRAÇA CASTELO BRANCO	51000443	449051	R\$ 3.500.000,00			
		1049	1	PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA ESTADOS UNIDOS, RUA ALZIRA E RUA BOLÍVIA.	21000429	449051	R\$ 3.000.000,00			
					21000441	449051	R\$ 150.000,00			
					11000441	449051	R\$ 90.000,00			
		1050	1	RECAPEAMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO ELDORADO	11000440	449051	R\$ 61.000,00			
					51000440	449051	R\$ 246.000,00			
		1051	1	RECAPEAMENTO DAS RUAS PAULO MAGNANI, EPITÁCIO PESSOA, JOÃO CAETANO DE SOUZA, VISCONDE DE MAUÁ E SÃO RAFAEL	21000432	449051	R\$ 350.000,00			
					11000432	449051	R\$ 250.000,00			
		1052	1	RECAPEAMENTO DE RUAS NOS BAIROS CAMPANÁRIO, CANHEMA, ELDORADO, CENTRO E CASA GRANDE.	11000442	449051	R\$ 160.000,00			
					51000442	449051	R\$ 640.000,00			
		1053	1	RECAPEAMENTO RUA IDA ESPAGIARI MARTINS	21000439	449051	R\$ 150.000,00			
					11000439	449051	R\$ 150.000,00			
		SUB-TOTAL ( SECRETARIA )						R\$ 12.540.000,00		
		TOTAL GERAL						R\$ 40.055.000,00		

\* Valores a serem apurados conforme preceitua o artigo 43, paragrafo 1º Inciso I, e paragrafo 2º da Lei 4.320/64.

## Apresentação

FLS.	06
	528/2017
Protocolo	d.

A Prefeitura de Diadema, com o propósito de propiciar melhorias contínuas aos munícipes vem, a cada exercício, investindo recursos em infraestrutura física para garantir maior eficiência e excelência nos serviços prestados. Comprometida com a transparência pública, de modo a todo cidadão saber o que se pretende realizar nos próximos quatro anos de gestão municipal, a Prefeitura Municipal apresenta este Plano de Obras. Nele, os interessados terão informações e imagens sobre as obras já iniciadas, para as quais será dada continuidade, além das obras a serem começadas, com as correspondentes metas físicas e financeiras, bem como investimentos totais a serem realizados.

Para complementar as informações prestadas, o presente Plano informa o benefício social a ser atingido com a execução de cada empreendimento.

Como poderá ser percebida, esta gestão teve o cuidado, apesar da crise econômica que afeta o País, em implementar obras em esferas sociais, como habitação, assistência social, educação, saúde e mobilidade urbana.

Este relatório disponibiliza as obras contempladas nesta gestão com endereço completo, datas de início e de término, valor do investimento, do repasse e da contrapartida.

Também constam no documento empreendimentos como a urbanização completa do Beira Rio, a remoção e o reassentamento das famílias em área de mananciais – Etapa Iguassu, Etapa Joaninha, Urbanização do Complexo Santa Elizabeth, a Urbanização Completa da Favela Naval – Etapa Piraporinha II e outras melhorias habitacionais. Além disso, há detalhes sobre obras em execução como a construção da Creche Irmã Dulce, da Creche Sagrado Coração de Jesus e a implantação da Rede Lucy Montoro, no Quarteirão da Saúde.

Vale destacar os informativos sobre futuros empreendimentos, no caso, o CAPS Infantil, e ainda a construção do CAPS AD (álcool e droga), que tem por finalidade proporcionar o atendimento de 230 atendimentos médicos ao mês.

Outro ponto de destaque neste documento fica por conta da divulgação de dados sobre a construção do Pronto Socorro Infantil entre a rua Venezuela e Irlanda, no Jardim das Nações, cuja obra está prevista para começar em 2018 e prevê o atendimento de urgência e emergência a 3.775 crianças ao mês.

De igual relevância são as informações sobre a construção do novo Hospital Municipal, localizado na avenida Dr. Ulisses Guimarães, com previsão de início das obras em 2019, e que deverá contar com um aumento de 20% de leitos hospitalares.

No segmento de Mobilidade Urbana, o documento também aborda investimentos como a implantação de sistema preferencial de transporte coletivo entre as ruas Rio de Janeiro e avenida Casa Grande.



# Obras em **EXECUÇÃO**

FLS.	07
528/2017	
Protocolo	2.



Plano de  
**OBRAS**  
2018-2021

## Urbanização Complexo Santa Elizabeth (Etapa Núcleo K)

Endereço: **Rua Chico Mendes, Vila São José**

Início da Obra: **2015**

Expectativa de Término: **2018**

% Físico Executado: **20%**

% Financeiro Executado: **20%**

Valor do Investimento: **R\$ 4.790.347,20**

Valor do Repasse: **R\$ 1.850.704,07<sup>1</sup>**

Valor de Contrapartida: **R\$ 2.939.643,13**

Objetivos Sociais: **Construção de 83  
unidades habitacionais**



## Remoção e Reassentamento de Famílias em Área de Mananciais (Etapa Iguassu)

Endereço: **Rua Iguassu, s/n° - Eldorado**

Início da Obra: **2016**

Expectativa de Término: **2018**

% Físico Executado: **65%**

% Financeiro Executado: **65%**

Valor do Investimento: **R\$ 7.540.861,35**

Valor do Repasse: **R\$ 4.412.951,30<sup>1</sup>**

Valor de Contrapartida: **R\$ 3.127.910,05**

Objetivos Sociais: **Construção de 83 unidades habitacionais (2017), infraestrutura (2017); Melhorias em 56 unidades habitacionais (2018); Construção de Centro comunitário (2018); Recuperação Ambiental (2018)**



## Remoção e Reassentamento de Famílias em Área de Mananciais (Etapa Joaninha)

Endereço: **Av. Nicola Imparato - Eldorado**

Início da Obra: **2015**

Expectativa de Término: **2018**

% Físico Executado: **31%**

% Financeiro Executado: **31%**

Valor do Investimento: **R\$ 7.855.808,24**

Valor do Repasse: **R\$ 6.281.011,43<sup>1</sup>**

Valor de Contrapartida: **R\$ 1.474.796,81**

Objetivos Sociais: **Infraestrutura, Contenção e Demolições no Loteamento Sítio Joaninha**



## Urbanização Integrada Da Favela Naval (Etapa Piraporinha I)

Endereço: **Rua Chico Mendes, Piraporinha**

Início da Obra: **2011**

Expectativa de Término: **2018**

% Físico Executado: **6,87**

% Financeiro Executado: **6,87**

Valor do Investimento: **R\$ 1.177.861,78**

Valor do Repasse: **R\$ 962.826,71<sup>1</sup>**

Valor de Contrapartida: **R\$ 215.035,07**

Objetivos Sociais: **implantação da infraestrutura no núcleo "K".**



## Canalização do **Córrego Grota Funda Olaria**

Endereço: **entre a represa Billings e estrada Pedreira Alvarenga**

Início da Obra: **2015**

Expectativa de Término: **2018**

% Físico Executado: **33%**

% Financeiro Executado: **31%**

Valor do Investimento: **R\$ 6.664.131,42**

Valor do Repasse: **R\$ 2.998.455,02<sup>1</sup>**

Valor de Contrapartida: **R\$ 2.381.676,40**

Objetivos Sociais: **canalização para separação de águas pluviais do esgotamento sanitário, terminando com a área insalubre**

Meta 2018: **67%**



## Construção da **Creche Irmã Dulce**

Endereço: **Rua Armelim A. F. Coutinho, 320 – Parque Real**

Início da Obra: **2016**

Expectativa de Término: **2018**

% Físico Executado: **55%**

% Financeiro Executado: **4%**

Valor do Investimento: **R\$ 2.173.601,24**

Valor do Repasse: **R\$ 1.022.506,55**

Valor de Contrapartida: **R\$1.151.094,69**

Objetivos Sociais: **ampliar a oferta para 480 vagas**

Meta 2018: **67%**



## Construção da Creche Sagrado Coração de Jesus

Endereço: **Av. Fundibem, 670 – Jd. Gazuza**

Início da Obra: **2016**

Expectativa de Término: **2018**

% Físico Executado: **54%**

% Financeiro Executado: **60%**

Valor do Investimento: **R\$ 3.413.371,06**

Valor do Repasse: **R\$ 1.514.336,40**

Valor de Contrapartida: **R\$ 1.899.034,66**

Objetivos Sociais: **ampliar a oferta em 140 vagas**





## Reforma da UBS Jd. Ruyce

Endereço: **Av. Eldorado, 817 – Jd. Ruyce**

Início da Obra: **2017**

Expectativa de Término: **2018**

% Físico Executado: **3%**

% Financeiro Executado: **3%**

Valor do Investimento: **R\$349.012,45**

Valor do Repasse: **R\$349.012,45**

Objetivos Sociais: **propiciar maior conforto aos 2.800  
pacientes que utilizam a UBS ao mês**



## Instalação da Rede Lucy Montoro

Endereço: **Av. Antônio Piranga, 614**

Início da Obra: **2016**

Expectativa de Término: **2018**

% Físico Executado: **52%**

% Financeiro Executado: **30%**


Valor do Investimento: **R\$ 5.900.000,00**

Valor do Repasse: **R\$ 5.900.000,00**

Objetivos Sociais: **Oferecer atendimento especializado em reabilitação de pacientes com deficiências físicas incapacitantes, motoras e sensório motoras**



# Novos EMPREENHIMENTOS



## Contenção de encostas

Endereço: **Bairro Eldorado e Parque Real**

Início da Obra: **2018**

Expectativa de Término: **2021**

Valor do Investimento: **R\$ 24.779.280,14**

Valor do Repasse: **R\$ 24.779.280,14**

Objetivos Sociais: **Estabilização de Taludes  
em áreas de risco de assentamentos precários**

Meta 2018: **25%**



## Urbanização **Complexo Beira Rio** (Etapa : Construção de Equipamento Comunitário)

Endereço: **Rua Ana Maria s/ nº, Serraria**

Início da Obra: **2018**

Expectativa de Término: **2018**

Valor do Investimento: **R\$ 1.575.644,24**

Valor do Repasse: **R\$ 1.575.644,24<sup>1</sup>**

Objetivos Sociais: **Atendimento às áreas Júpiter II,  
Beira Rio, Inverno Verão e Yamberê II.**



## Remoção e Reassentamento de Famílias em Área De Mananciais (Etapa Iguassu - Elevatória)

Endereço: **Rua Iguassu, s/n° - Eldorado**

Início da Obra: **2018**

Expectativa de Término: **2018**

Valor do Investimento: **R\$ 1.625.651,34**

Valor do Repasse: **R\$ 1.544.368,77<sup>1</sup>**

Valor de Contrapartida: **R\$ 81.282,57**

Objetivos Sociais: **Execução de Estação Elevatória  
de esgoto e linha de recalque.**

## Remoção e Reassentamento de Famílias em Área De Mananciais (Etapa Joaninha- Elevatória)

Endereço: **Av. Nicola Imparato - Eldorado**

Início da Obra: **2018**

Expectativa de Término: **2018**

Valor do Investimento: **R\$ 625.373,70**

Valor do Repasse: **R\$ 595.594,00<sup>1</sup>**

Valor de Contrapartida: **R\$ 29.779,70**

Objetivos Sociais: **Execução de Estação Elevatória de  
esgoto e Linha de recalque Loteamento Sítio Joaninha**



## Urbanização Complexo Beira Rio (Etapa Yamberê II)

Endereço: **Rua Capela** confluência com a Rua Ipoá

Início da Obra: **2018**

Expectativa de Término: **2019**

Valor do Investimento: **R\$ 3.562.491,02**

Valor do Repasse: **R\$ 1.869.389,83<sup>1</sup>**

Valor de Contrapartida: **R\$ 1.693.104,19**

Objetivos Sociais: **Construção de 77 unidades habitacionais em área disponível do Conjunto Habitacional Yamberê II.**

Meta 2018: **30%**





## Urbanização Complexo Santa Elizabeth (Etapa Santa Elizabeth)

Endereço: **Rua Padre Antônio Tomaz, 105**

Início da Obra: **2018**

Expectativa de Término: **2020**

Valor do Investimento: **R\$ 5.121.275,45**

Valor do Repasse: **R\$ 5.057.915,15<sup>1</sup>**

Valor de Contrapartida: **R\$ 63.360,30**

Objetivos Sociais: **Melhorias em 129 unidades habitacionais existentes e contenção em áreas de risco**

Meta 2018: **52%**



## Urbanização Complexo Beira Rio (Etapa - Inverno Verão)

Endereço: **Rua Inverno Verão**

Início da Obra: **2018**

Expectativa de Término: **2019**

Valor do Investimento: **R\$ 2.936.480,56**

Valor do Repasse: **R\$ 2.386.913,12<sup>1</sup>**

Valor de Contrapartida: **R\$ 549.567,44**

Objetivos Sociais: **Melhorias pavimentação e drenagem de núcleo**

Meta 2018: **30%**

## Urbanização Integrada Da Favela Naval (Etapa Piraporinha II)

Endereço: **Rua Idealópolis, 200 - bairro Piraporinha**

Início da Obra: **2018**

Expectativa de Término: **2019**

Valor do Investimento: **R\$ 2.328.818,52**

Valor do Repasse: **R\$ 428.818,52<sup>1</sup>**

Valor de Contrapartida: **R\$ 1.900.000,00**

Objetivos Sociais: **Construção das 12 unidades habitacionais verticais, construção de 11 embriões mais construção de quadra de esporte e área de lazer.**

Meta 2018: **88%**



## Urbanização Integrada da Favela Naval (Etapa Piraporinha II - Melhorias habitacionais)

Endereço: **Rua Idealópolis, 200 - bairro Piraporinha**

Início da Obra: **2018**

Expectativa de Término: **2018**

Valor do Investimento: **R\$ 650.000,00**

Valor do Repasse: **R\$ 650.000,00<sup>1</sup>**

Objetivos Sociais: **Melhorias em 136 unidades  
habitacionais**



## Construção do CAPS Infantil

Endereço: **Av. Alda com Rua Coimbra**

Previsão de Início da Obra: **2018**

Expectativa de Término: **2019**

Valor do Investimento: **R\$ 2.947.179,00**

Valor do Repasse: **R\$ 2.300.004,00**

Valor de Contrapartida: **R\$ 642.175,00**

Objetivos Sociais: **propiciar 530 atendimentos infantis  
ao mês em local próprio e com infraestrutura adequada**

Meta 2018: **60%**



## Construção do CAPS AD

Endereço: **Av. Alda com Rua Coimbra**

Previsão de Início da Obra: **2018**

Expectativa de Término: **2019**

Valor do Investimento: **R\$ 2.763.425,00**

Valor do Repasse: **R\$ 2.300.004,00**

Valor de Contrapartida: **R\$ 458.421,00**

Objetivos Sociais: **propiciar 230 atendimentos ao mês em local próprio e com infraestrutura adequada**

Meta 2018: **60%**



## Construção do CAPS III

Endereço: **Av. Alda com Rua Coimbra**

Previsão de Início da Obra: **2018**

Expectativa de Término: **2019**

Valor do Investimento: **R\$ 2.721.056,00**

Valor do Repasse: **R\$ 2.300.004,00**

Valor de Contrapartida: **R\$ 416.052,00**

Objetivos Sociais: **propiciar 363 atendimentos ao mês em local próprio e com infraestrutura adequada**

Meta 2018: **60%**



## Construção da UBS Vila Paulina

Endereço: **Rua Afrânio Peixoto, s/n**

Previsão de Início da Obra: **2018**

Expectativa de Término: **2020**

Valor do Investimento: **R\$ 4.500.000,00**

Recurso Próprio: **R\$ 4.500.000,00**

Objetivos Sociais: **oferecer 3.640 atendimentos básicos ao mês, próximo ao moradores do Sítio Joaninha**

Meta 2018: **10%**



## Construção do Pronto Atendimento Infantil

Endereço: **Rua Venezuela e Rua Irlanda**

Previsão de Início da Obra: **2018**

Expectativa de Término: **2020**

Valor do Investimento: **R\$ 4.600.000,00**

Recurso Próprio: **R\$ 4.600.000,00**

Objetivos Sociais: **proporcionar atendimento de urgência/  
emergência a 3775 crianças ao mês**

Meta 2018: **30%**



## Reforma e Ampliação da Base do Serviço de **Atendimento Móvel de Urgência - Samu**

Endereço: **Rua Páscoa Campi - Centro**

Previsão de Início da Obra: **2019**

Expectativa de Término: **2020**

Valor do Investimento: **R\$ 1.000.000,00**

Recurso Próprio: **R\$ 1.000.000,00**

Objetivos Sociais: **ampliar em 70% o espaço com  
adequação física**



## Construção do **Novo Hospital Municipal**

Endereço: **Av. Ulisses Guimarães, 3966**

Previsão de Início da Obra: **2019**

Expectativa de Término: **2021**

Valor do Investimento: **R\$ 124.000.000,00**

Valor do Repasse: **R\$ 124.000.000,00**

Objetivos Sociais: **ofertar espaço adequado e moderno com aumento de 20% na oferta de leitos hospitalares**



## Construção do Centro Dia do Idoso

Endereço: **Avenida Alda com Rua Coimbra**

Previsão de Início da Obra: **2018**

Expectativa de Término: **2019**

Valor do Investimento: **R\$ 1.660.607,35**

Valor do Repasse: **R\$ 500.000,00**

Valor de Contrapartida: **R\$ 1.160.607,35**

Objetivos Sociais: **oferecer espaço de convívio integrado e multidisciplinar ao munícipe idoso**

Meta 2018: **5%**

## Construção da **Central de Triagem Chico Mendes**

Endereço: **Avenida Chico Mendes s/nº**

Previsão de Início da Obra: **2018**

Expectativa de Término: **2018**

Valor do Investimento: **R\$ 2.705.387,44**

Valor do Repasse: **R\$ 1.962.523,59**

Valor de Contrapartida: **R\$ 742.863,85**

Objetivos Sociais: **oferecer espaço adequado á cooperativas  
de economia solidária**



## Construção da Central Geral de Processamento do Jardim Inamar

Endereço: **Avenida Piramide s/nº**

Previsão de Início da Obra: **2018**

Expectativa de Término: **2019**

Valor do Investimento: **R\$ 3.462.276,71**

Valor do Repasse: **R\$ 2.487.476,41**

Valor de Contrapartida: **R\$ 974.800,30**

Objetivos Sociais: **oferecer espaço adequado à cooperativas  
de economia solidária**

Meta 2018: **12%**



## Implantação de **Tratamento Preferencial para Transporte Coletivo** Entre as Ruas Rio De Janeiro e Av. Casa Grande (Pac Mobilidade)

Endereço: **Avenida Casa Grande e Rua Rio de Janeiro**

Previsão de Início da Obra: **2018**

Expectativa de Término: **2019**

Valor do Investimento: **R\$ 19.848.081,43**

Valor do Repasse: **R\$ 18.601.081,83**

Valor de Contrapartida: **R\$ 1.247.000,00**

Objetivos Sociais: **promover celeridade no trânsito de ônibus**

Meta 2018: **24%**

## Prolongamento da Av. Fundibem (Pac Mobilidade)

Endereço: **Avenida Fundibem**

Previsão de Início da Obra: **2019**

Expectativa de Término: **2019**

Valor do Investimento: **R\$ 6.076.358,03**

Valor do Repasse: **R\$ 5.348.128,63**

Valor de Contrapartida: **R\$ 728.230,00**

Objetivos Sociais: **promover fácil e rápido acesso até São Bernardo do Campo**





## Ligação da Av. Casa Grande com Av. Marechal Castelo Branco (Pac Mobilidade)

Endereço: **Rua Mem de Sá**

Previsão de Início da Obra: **2019**

Expectativa de Término: **2019**

Valor do Investimento: **R\$ 3.746.625,50**

Valor do Repasse: **R\$ 3.246.625,50**

Valor de Contrapartida: **R\$ 500.000,00**

Objetivos Sociais: **promover facilidade e rapidez no acesso  
entre as avenidas Castelo Banco e Casa Grande**



## Abertura do Cruzamento da Av. Fagundes de Oliveira Com Corredor ABD (Pac Mobilidade)

Endereço: **Avenida Piraporinha até Fagundes de Oliveira**

Previsão de Início da Obra: **2019**

Expectativa de Término: **2019**

Valor do Investimento: **R\$ 3.515.484,55**

Valor do Repasse: **R\$ 3015.484,55**

Valor de Contrapartida: **R\$ 500.000,00**

Objetivos Sociais: **diminuição do tráfego local com facilidade de acesso entre as avenidas Fagundes de Oliveira e Corredor ABD**



## Implantação de Binário com Av. Nossa Senhora dos Navegantes e Frei Ambrósio de Oliveira (Pac Mobilidade)

Endereço: **Av Nossa Senhora dos Navegantes e Frei Ambrósio de Oliveira**

Previsão de Início da Obra: **2020**

Expectativa de Término: **2020**

Valor do Investimento: **R\$ 13.779.574,94**

Valor do Repasse: **R\$ 13.179.574,94**

Valor de Contrapartida: **R\$ 600.000,00**

Objetivos Sociais: **promover celeridade ao trânsito local**



## Construção de Viaduto na Av. Ruyce Ferraz Alvim Sobre Rod. Imigrantes (Pac Mobilidade)

Endereço: **Avenida Ruyce Ferraz Alvim sobre R Imigrantes**

Previsão de Início da Obra: **2021**

Expectativa de Término: **2021**

Valor do Investimento: **R\$ 24.153.786,27**

Valor do Repasse: **R\$ 23.244.086,27**

Valor de Contrapartida: **R\$ 909.700,00**

Objetivos Sociais: **propiciar aumento da mobilidade urbana com consequente diminuição do trânsito local**



## Implantação de Tratamento Preferencial para Transporte Coletivo na Av. Ruyce Ferraz Alvim e Av. Antonio Dias Adorno (**Pac Mobilidade**)

Endereço: **Av Ruyce F Alvim e Av. Antonio D. Adorno**

Previsão de Início da Obra: **2021**

Expectativa de Término: **2021**

Valor do Investimento: **R\$ 26.394.286,64**

Valor do Repasse: **R\$ 25.494.286,24**

Valor de Contrapartida: **R\$ 900.000,00**

Objetivos Sociais: **priorizar a mobilidade de transporte coletivo entre as avenidas Ruyce F. Alvim e Antônio Dias Adorno**



## Construção do Terminal Regional Entre SBC e Diadema (**Pac Mobilidade**)

Endereço: **Rua Rio de Janeiro**

Previsão de Início da Obra: **2021**

Expectativa de Término: **2021**

Valor do Investimento: **R\$ 48.463.971,75**

Valor do Repasse: **R\$ 23.463.971,75**

Valor de Contrapartida: **R\$ 25.000.000,00**

Objetivos Sociais: **Integralizar acesso de transporte público intermunicipal**

## Recapemanto das Ruas, Paulo Magnani, Epitacio Pessoa, João Caetano, Visconde de Mauá E São Rafael

Previsão de Início da Obra: **2018**

Expectativa de Término: **2018**

Valor do Investimento: **R\$ 600.000,00**

Valor do Repasse: **R\$ 350.000,00**

Valor de Contrapartida: **R\$ 250.000,00**

Objetivos Sociais: **melhorar o trânsito local**

## Recapemanto das Ruas, **Ida Espagiari Martins**

Previsão de Início da Obra: **2018**

Expectativa de Término: **2018**

Valor do Investimento: **R\$ 300.000,00**

Valor do Repasse: **R\$ 150.000,00**

Valor de Contrapartida: **R\$ 150.000,00**

Objetivos Sociais: **melhorar o trânsito local**





## Recapemanto de diversas Ruas, Bairro do Eldorado

Previsão de Início da Obra: **2018**

Expectativa de Término: **2018**

Valor do Investimento: **R\$ 307.000,00**

Valor do Repasse: **R\$ 245.850,00**

Valor de Contrapartida: **R\$ 61.150,00**

Objetivos Sociais: **melhorar o trânsito local**



## Recapemanto da travessa, **Estados Unidos,** **Rua Alzira e Rua Bolívia**

Previsão de Início da Obra: **2018**

Expectativa de Término: **2018**

Valor do Investimento: **R\$ 240.000,00**

Valor do Repasse: **R\$ 150.000,00**

Valor de Contrapartida: **R\$ 90.000,00**

Objetivos Sociais: **melhorar o trânsito local**



## Recapemanto de Ruas nos Bairros, Campanario, Centro, Canhema, Eldorado e Casa Grande

Previsão de Início da Obra: **2018**

Expectativa de Término: **2018**

Valor do Investimento: **R\$ 800.000,00**

Valor do Repasse: **R\$ 640.050,00**

Valor de Contrapartida: **R\$ 159.950,00**

Objetivos Sociais: **melhorar o trânsito local**



## Reforma do Parque Eldorado

Endereço: **Av .Nossa Senhora dos Navegantes, 145**

Previsão de Início da Obra: **2018**

Expectativa de Término: **2018**

Valor do Investimento: **R\$ 300.000,00**

Valor do Repasse: **R\$ 243.750,00**

Valor de Contrapartida: **R\$ 56.250,00**

Objetivos Sociais: **oferecer espaço harmonioso para lazer**

## Reforma do **Velório**

Endereço: **Alameda da Saudade, 427**

Início da Obra: **2018**

Expectativa de Término: **2018**

Valor do Investimento: **R\$ 170.579,78**

Valor do Repasse: **R\$ 150.000,00**

Valor de contra partida: **R\$ 20.579,78**

Objetivos Sociais: **Propiciar local com instalações adequadas à cerimônia funebre**



## Reforma do **Campo Eldorado**

Endereço: **Av .Nossa Senhora dos Navegantes, 145**

Previsão de Início da Obra: **2018**

Expectativa de Término: **2018**

Valor do Investimento: **R\$ 340.000,00**

Valor do Repasse: **R\$ 277.850,00**

Valor de Contrapartida: **R\$ 62.125,00**

Objetivos Sociais: **promover iluminação adequada para prática de esportes**

## Reforma do **Campo Albatroz**

Endereço: **Rua Albatroz 171**

Previsão de Início da Obra: **2018**

Expectativa de Término: **2018**

Valor do Investimento: **R\$ 1.170.000,00**

Valor do Repasse: **R\$ 975.000,00**

Valor de Contrapartida: **R\$ 195.000,00**

Objetivos Sociais: **oferecer gramado adequado  
à prática esportiva**



## Reforma da Praça **Castelo Branco**

Endereço: **Praça Castelo Branco**

Previsão de Início da Obra: **2018**

Expectativa de Término: **2018**

Valor do Investimento: **R\$ 3.000.000,00**

Valor do Repasse: **R\$ 3.000.000,00<sup>1</sup>**

Objetivos Sociais: **oferecer espaço adequado ao lazer dos munícipes**





## Construção de 4 Centros de Educação Unificada (Ceduca)

Endereços: **bairros Inamar, Campanário, Vila Nogueira e Eldorado**

Previsão de Início da Obra: **2019**

Expectativa de Término: **2021**


Valor do Investimento: **R\$ 150.000.000,00**

Recurso Próprio: **R\$ 150.000.000,00**


Objetivos Sociais: **desenvolver o protagonismo do estudante na prática do conhecimento científico em crianças de 0 a 10 anos, ampliando os territórios de aprendizagem**



# Plano de Obras POR BAIRROS

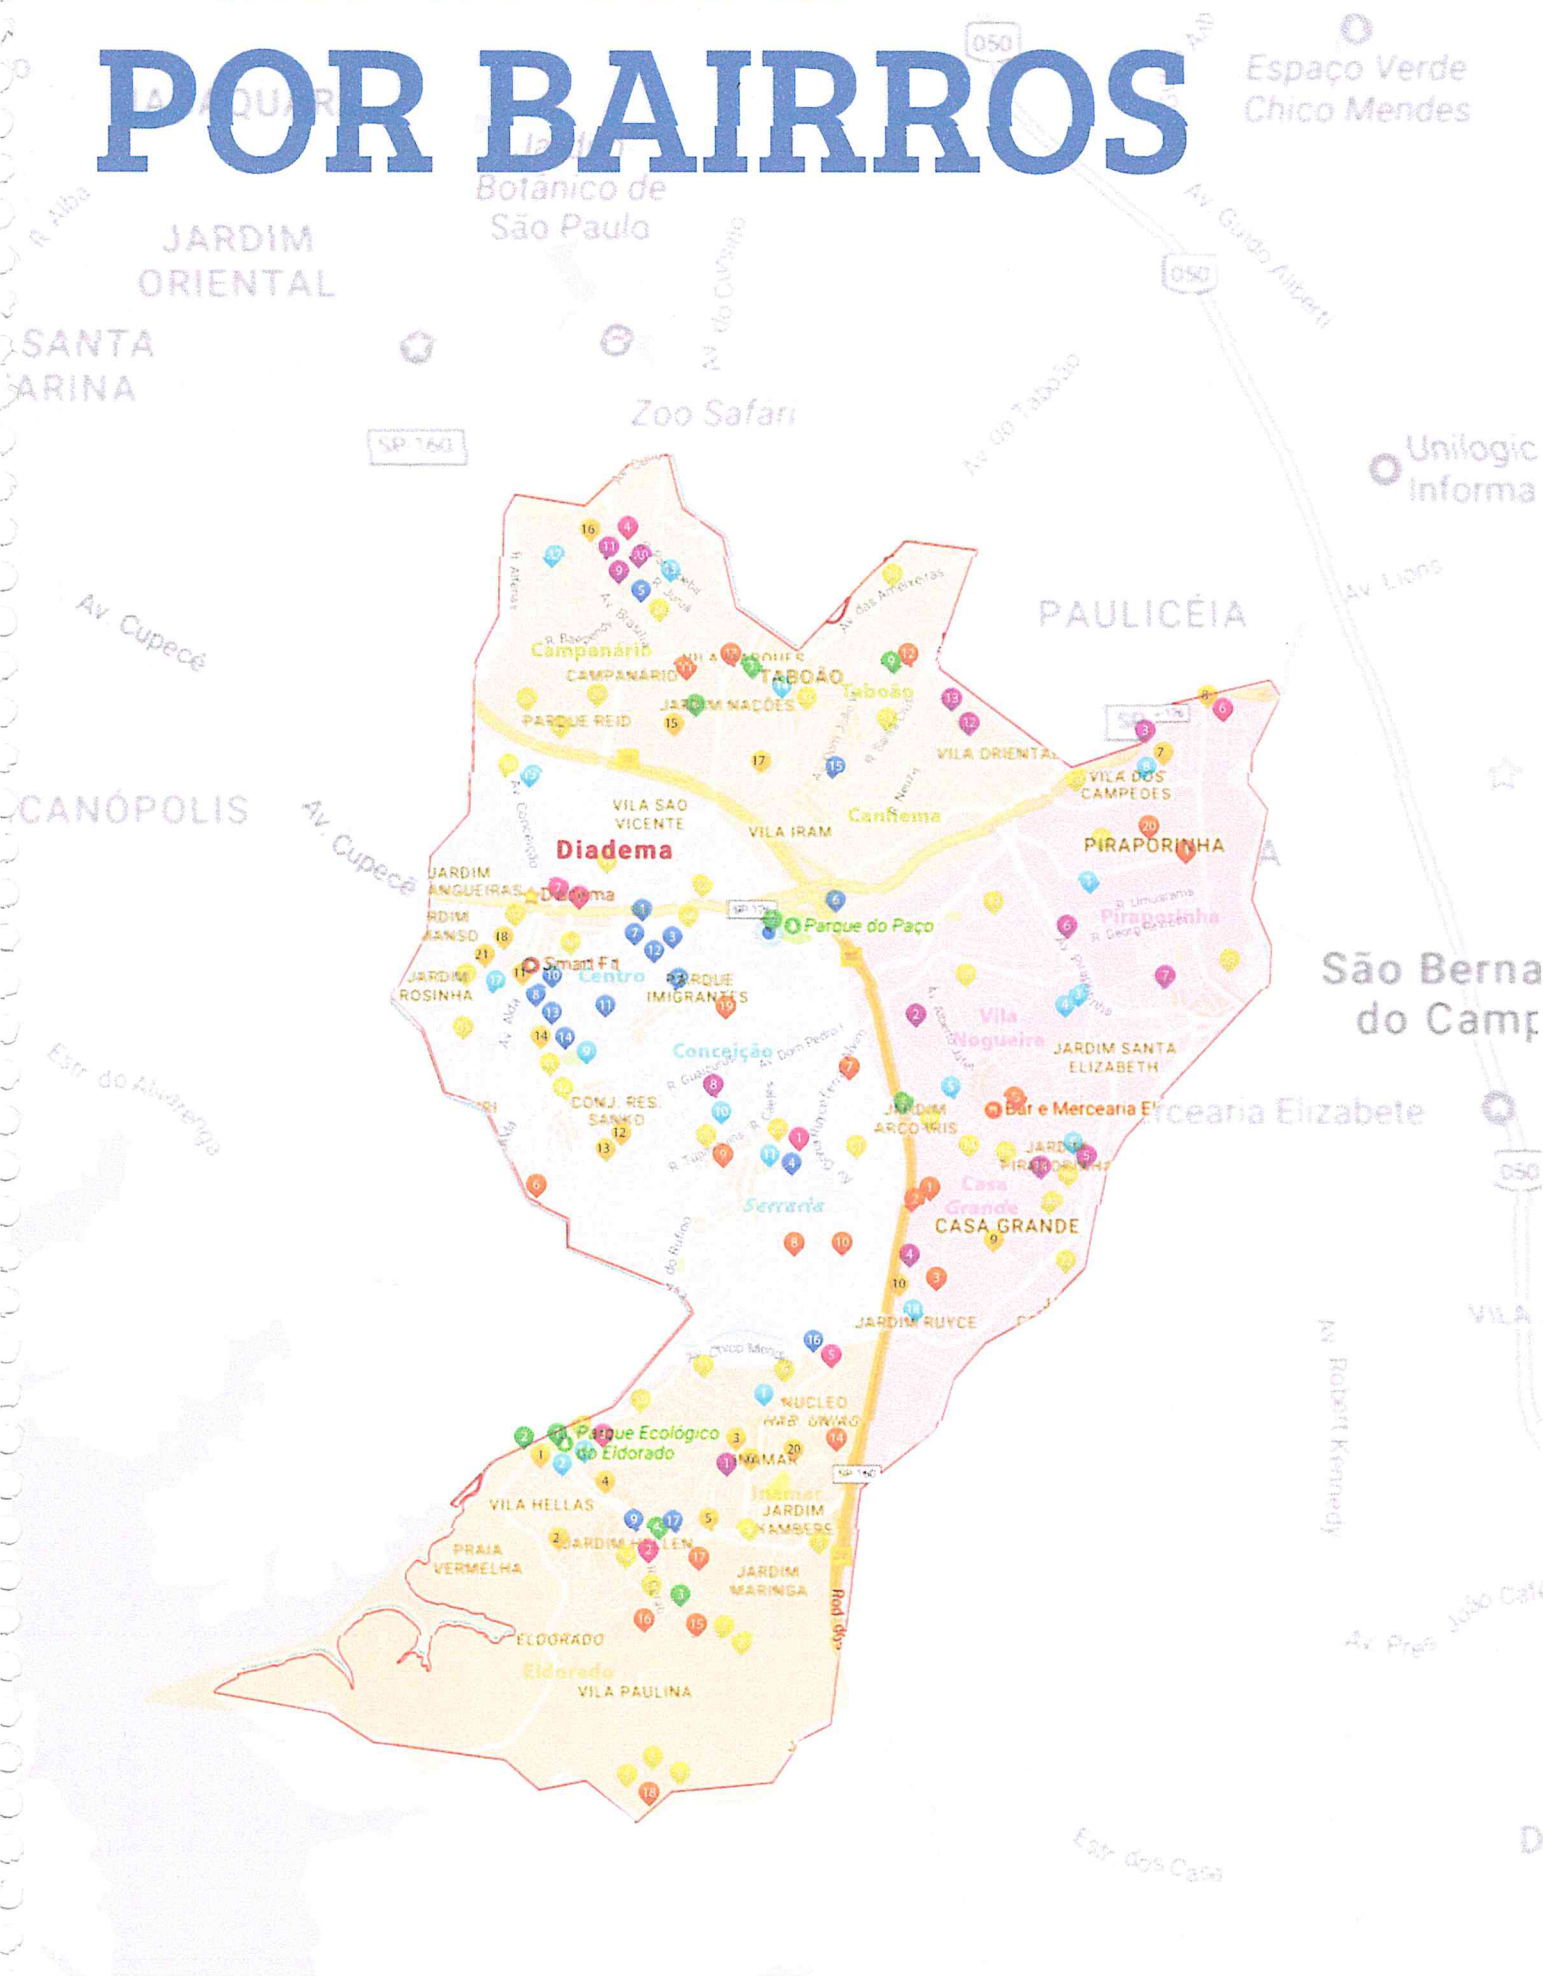


# Centro

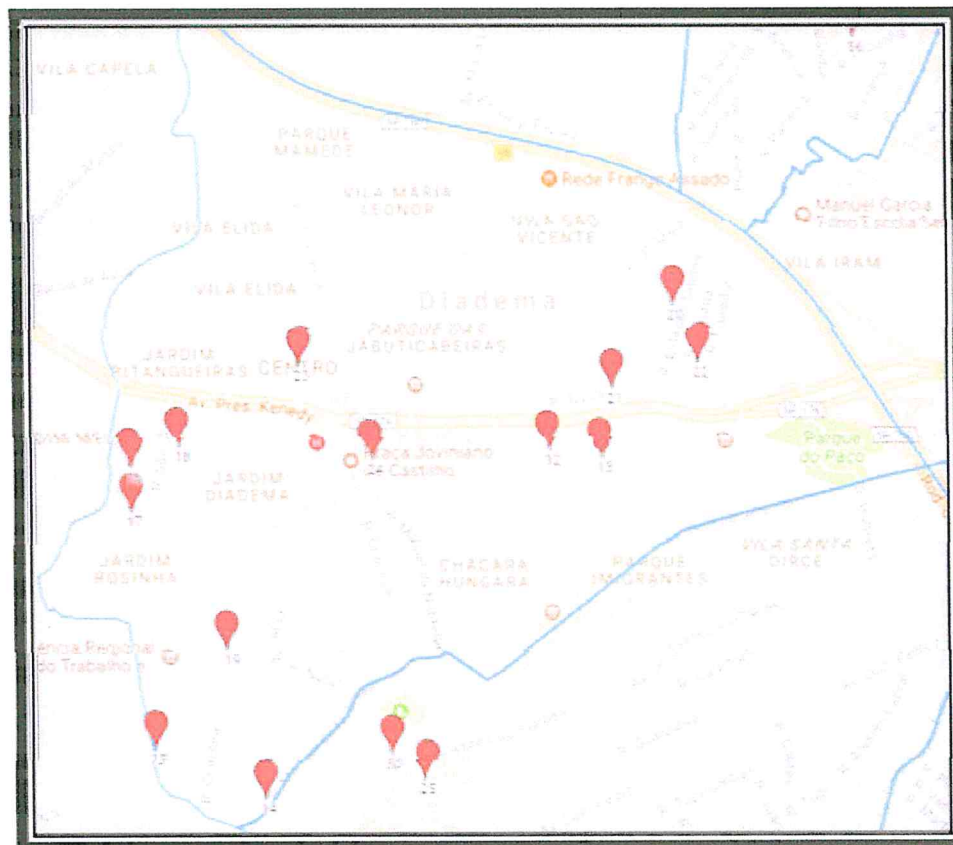


ID	OBRA	ENDEREÇO DE REFERÊNCIA	BAIRRO
12	INSTALAÇÃO DA REDE LUCY MONTORO	AV. ANTÔNIO PIRANGA, 614	CENTRO
13	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	RUA PÁSCOA CAMPI	CENTRO
14	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO	AV. AIDA, 1217	CENTRO
15	RECAPEAMENTO DAS RUAS, PAULO MAGNANI, EPITACIO PESSOA, JOÃO CAETANO, VISCONDE DE MAUÁ E SÃO RAFAEL	RUA EPITACIO PESSOA	CENTRO
16	RECAPEAMENTO DAS RUAS, PAULO MAGNANI, EPITACIO PESSOA, JOÃO CAETANO, VISCONDE DE MAUÁ E SÃO RAFAEL	RUA JOÃO CAETANO	CENTRO
17	RECAPEAMENTO DAS RUAS, PAULO MAGNANI, EPITACIO PESSOA, JOÃO CAETANO, VISCONDE DE MAUÁ E SÃO RAFAEL	RUA VISCONDE DE MAUÁ	CENTRO
18	RECAPEAMENTO DAS RUAS, PAULO MAGNANI, EPITACIO PESSOA, JOÃO CAETANO, VISCONDE DE MAUÁ E SÃO RAFAEL	RUA SÃO RAFAEL	CENTRO
19	RECAPEAMENTO DA RUA IDA ESPAGIARI MARTINS	R. IDA ESPAGIARI MARTINS	CENTRO
20	RECAPEAMENTO DA TRAVESSA ESTADOS UNIDOS, RUA ALZIRA E RUA BOLÍVIA	TRAVESSA ESTADOS UNIDOS	CENTRO
21	RECAPEAMENTO DA TRAVESSA ESTADOS UNIDOS, RUA ALZIRA E RUA BOLÍVIA	RUA ALZIRA	CENTRO
22	RECAPEAMENTO DA TRAVESSA ESTADOS UNIDOS, RUA ALZIRA E RUA BOLÍVIA	RUA BOLÍVIA	CENTRO
23	RECAPEAMENTO DE RUAS NOS BAIRRO CENTRO	CENTRO	CENTRO
24	REFORMA DA PRAÇA CASTELO BRANCO	PRAÇA CASTELO BRANCO	CENTRO

# Conceição e Serraria

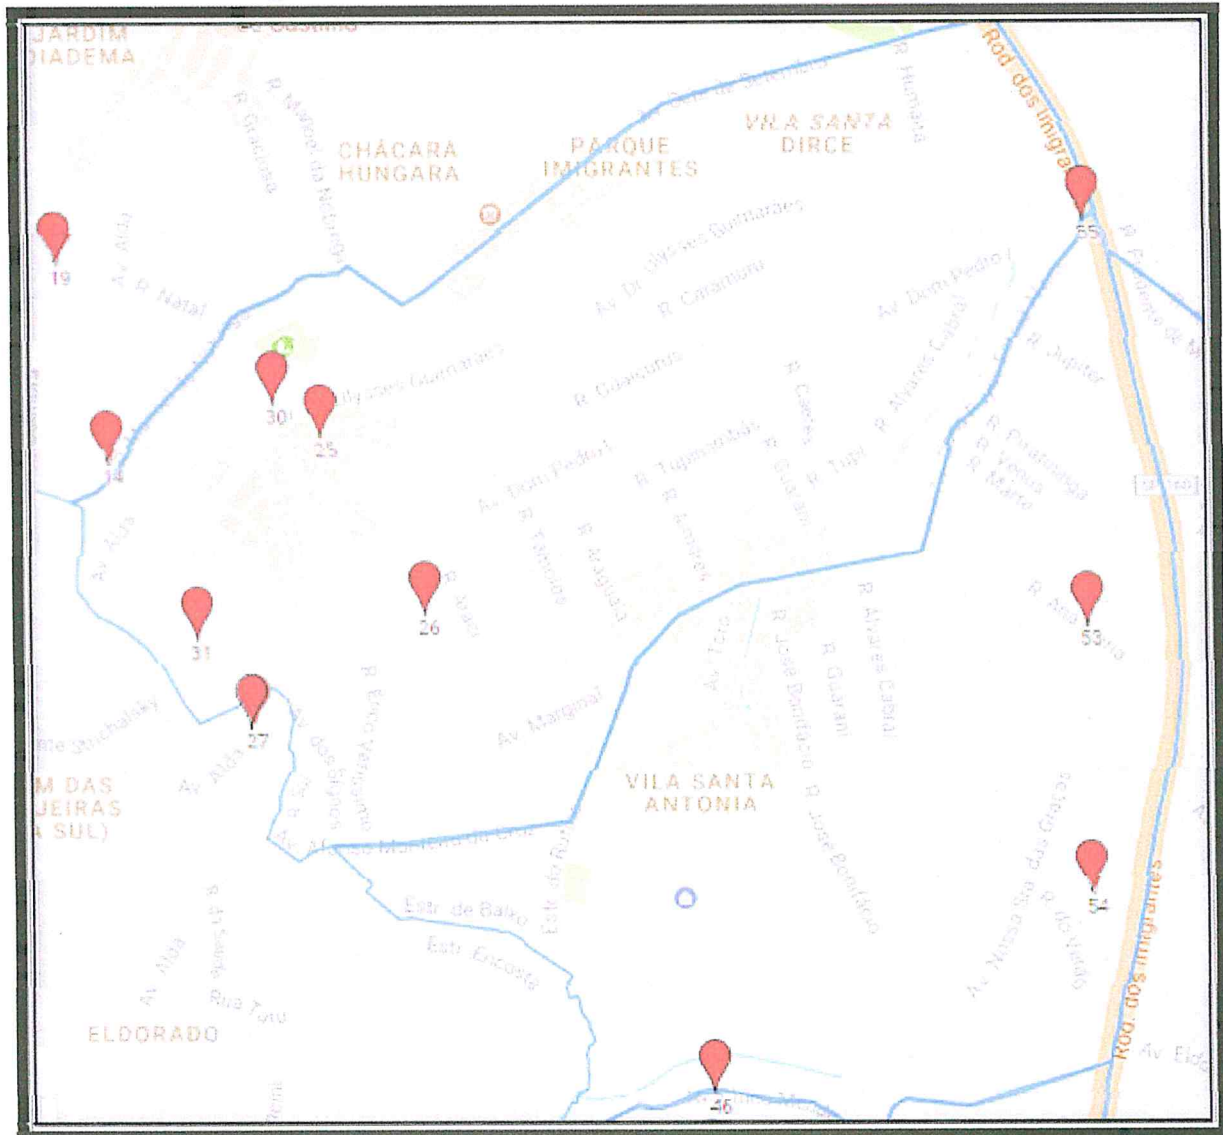

ID	OBRA	ENDEREÇO DE REFERÊNCIA	BAIRRO
25	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	PARQUE REAL	CONCEIÇÃO
26	CONSTRUÇÃO DA CRECHE IRMÃ DULCE	RUA ARMELIM A. F. COUTINHO, 320	CONCEIÇÃO
27	CONSTRUÇÃO DO CAPS INFANTIL	AV. ALDA, 1217	CONCEIÇÃO
28	CONSTRUÇÃO DO CAPS AD	AV. ALDA, 1217	CONCEIÇÃO
29	CONSTRUÇÃO DO CAPS III	AV. ALDA, 1217	CONCEIÇÃO
30	REFORMA DO VELÓRIO	AL. SAUDADE, 427	CONCEIÇÃO
31	RECAPEAMENTO DAS RUAS, PAULO MAGNANI, EPITACIO PESSOA, JOÃO CAETANO, VISCONDE DE MAUÁ E SÃO RAFAEL	R. PAULO MAGNANI	CONCEIÇÃO
53	URBANIZAÇÃO COMPLEXO BEIRA RIO (ETAPA : CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO)	R. DO INVERNO, 65	SERRARIA
54	URBANIZAÇÃO COMPLEXO BEIRA RIO (ETAPA - INVERNO VERÃO)	R. DO INVERNO, 65	SERRARIA
55	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO NA AV. RUYCE FERRAZ ALVIM SOBRE ROD. IMIGRANTES (PAC MOBILIDADE)	AV. DONA RUYCE FERRAZ ALVIM, 900	SERRARIA


# Região Norte

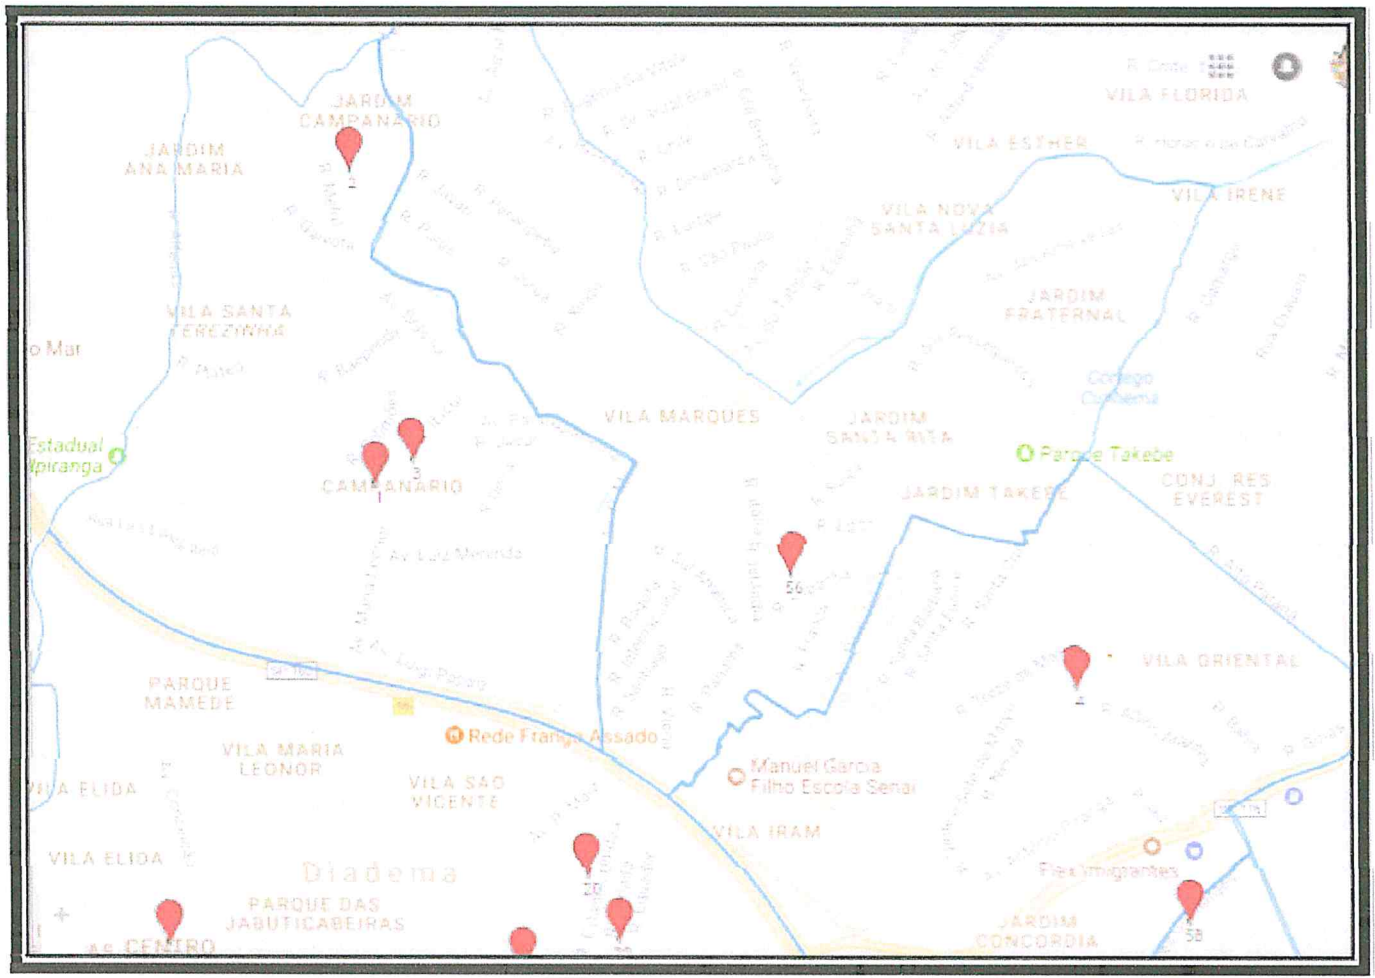

ID	OBRA	ENDEREÇO DE REFERÊNCIA	BAIRRO
1	RECAPEAMENTO DE RUAS NOS BAIRRO CAMPANARIO	CAMPANÁRIO	CAMPANÁRIO
2	REFORMA DO CAMPO ALBATROZ	RUA ALBATROZ, 171	CAMPANÁRIO
3	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO UNIFICADA (CEDUCA)	CAMPANÁRIO	CAMPANÁRIO
4	RECAPEAMENTO DE RUAS NOS BAIRRO CANHEMA	CANHEMA	CANHEMA
56	CONSTRUÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL	RUA IRLANDA	TABOÃO

# Região Sul


FLS..... 60  
528 | 2017  
Protocolo 62

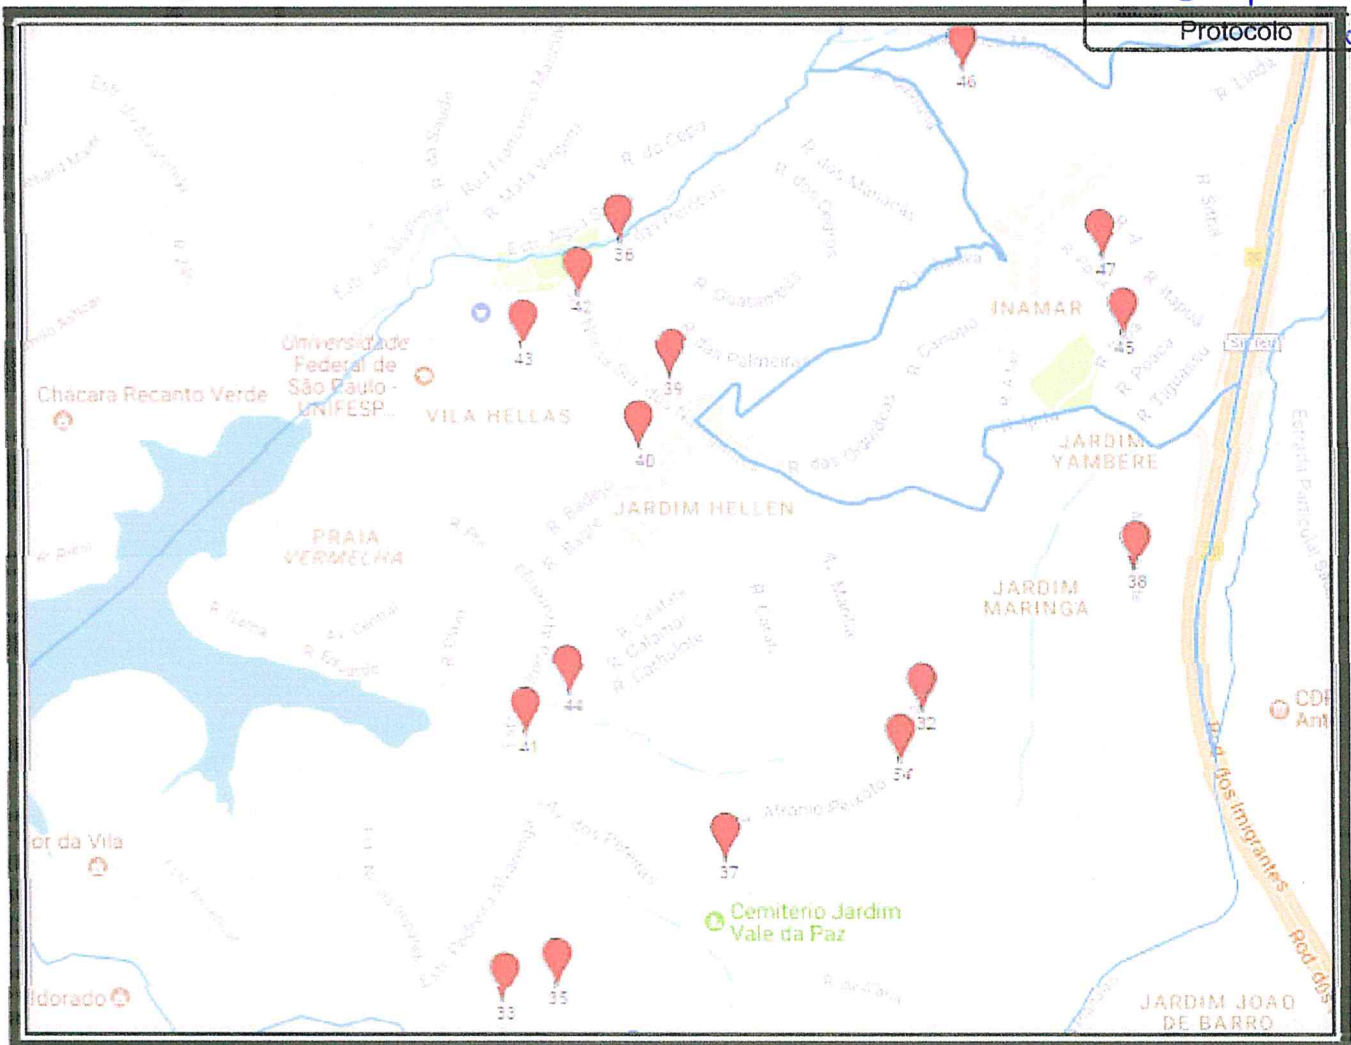

ID	OBRA	ENDEREÇO DE REFERÊNCIA	BAIRRO
32	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS EM ÁREA DE MANANCIAS (ETAPA IGUASSU)	RUA IGUASSU	ELDORADO
33	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS EM ÁREA DE MANANCIAS (ETAPA JOANINHA)	AV. NICOLA IMPARATO	ELDORADO
34	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS EM ÁREA DE MANANCIAS (ETAPA IGUASSU - ELEVATÓRIA)	RUA IGUASSU	ELDORADO
35	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS EM ÁREA DE MANANCIAS (ETAPA JOANINHA- ELEVATÓRIA)	AV. NICOLA IMPARATO	ELDORADO
36	CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO GROTA FUNDA - OLARIA	R. DAS PEROBAS, 244	ELDORADO
37	CONSTRUÇÃO DA UBS VILA PAULINA	VILA PAULINA	ELDORADO
38	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL GERAL DE PROCESSAMENTO DO JARDIM INAMAR.	AVENIDA PIRAMIDE	ELDORADO
39	IMPLANTAÇÃO DE BINÁRIO COM AV. NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES E FREI AMBRÓSIO DE OLIVEIRA (PAC MOBILIDADE)	FREI AMBRÓSIO DE OLIVEIRA	ELDORADO
40	PROLONGAMENTO DA AV. NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES ATÉ AV. PIRÂMIDE (PAC MOBILIDADE)	RUA FREI AMBRÓSIO DE OLIVEIRA	ELDORADO
41	RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE ELDORADO	ELDORADO	ELDORADO
42	REFORMA DO PARQUE ELDORADO	AV. NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 145	ELDORADO
43	REFORMA DO CAMPO ELDORADO	AV. NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 145	ELDORADO
44	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO UNIFICADA (CEDUCA)	ELDORADO	ELDORADO
45	URBANIZAÇÃO COMPLEXO BEIRA RIO(ETAPA YAMBERÊ II)	RUA IPOÁ	INAMAR
46	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE TRIAGEM CHICO MENDES	AV. CHICO MENDES	INAMAR
47	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO UNIFICADA (CEDUCA)	INAMAR	INAMAR

# Piraporinha e Vl. Nogueira


FLS. 61  
528/2017  
Protocolo 2

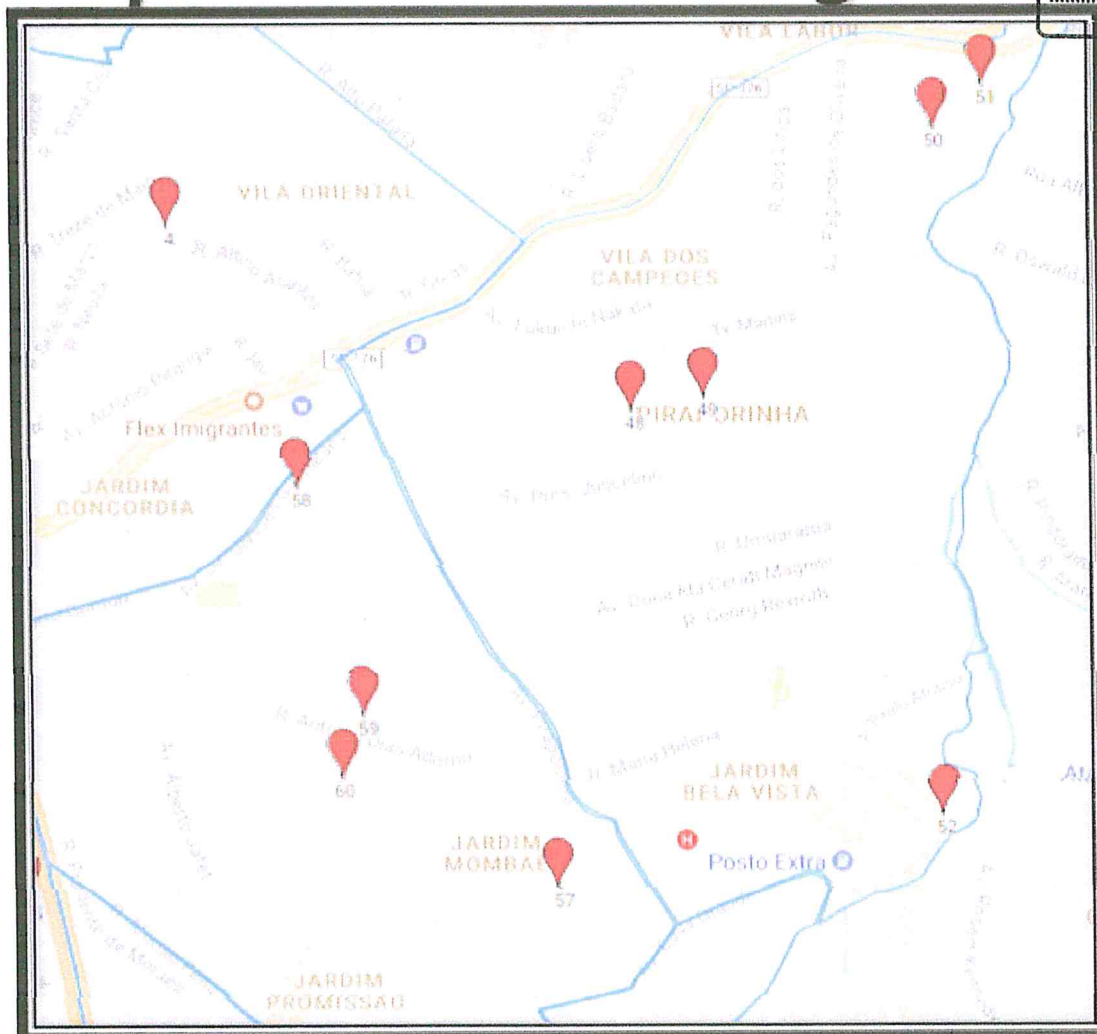

ID	OBRA	ENDEREÇO DE REFERÊNCIA	BAIRRO
48	URBANIZAÇÃO COMPLEXO SANTA ELIZABETH (ETAPA NÚCLEO K)	RUA CHICO MENDES	PIRAPORINHA
49	URBANIZAÇÃO INTEGRADA DA FAVELA NAVAL (ETAPA PIRAPORINHA I)	RUA CHICO MENDES	PIRAPORINHA
50	URBANIZAÇÃO INTEGRADA DA FAVELA NAVAL (ETAPA PIRAPORINHA II - CONSTRUÇÃO)	RUA IDEALÓPOLIS, 200	PIRAPORINHA
51	URBANIZAÇÃO INTEGRADA DA FAVELA NAVAL (ETAPA PIRAPORINHA II- MELHORIAS HABITACIONAIS)	RUA IDEALÓPOLIS, 200	PIRAPORINHA
52	ABERTURA DO CRUZAMENTO DA AV. FAGUNDES DE OLIVEIRA COM CORREDOR ABD (PAC MOBILIDADE)	RUA FAGUNDES DE OLIVEIRA, 182	PIRAPORINHA
57	URBANIZAÇÃO COMPLEXO SANTA ELIZABETH (ETAPA SANTA ELIZABETH)	RUA PADRE ANTÔNIO TOMAZ, 105	VILA NOGUEIRA
58	CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL MUNICIPAL	AV. ULISSES GUIMARÃES, 3966	VILA NOGUEIRA
59	IMPLANTAÇÃO DE TRATAMENTO PREFERENCIAL PARA TRANSPORTE COLETIVO NA AV. RUYCE FERRAZ ALVIM E AV. ANTONIO DIAS ADORNO (PAC MOBILIDADE)	AV. ANTONIO D. ADORNO	VILA NOGUEIRA
60	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO UNIFICADA (CEDUCA)	VILA NOGUEIRA	VILA NOGUEIRA

# Serraria e Casa Grande

FLS. 62  
528/2017  
Protocolo α.

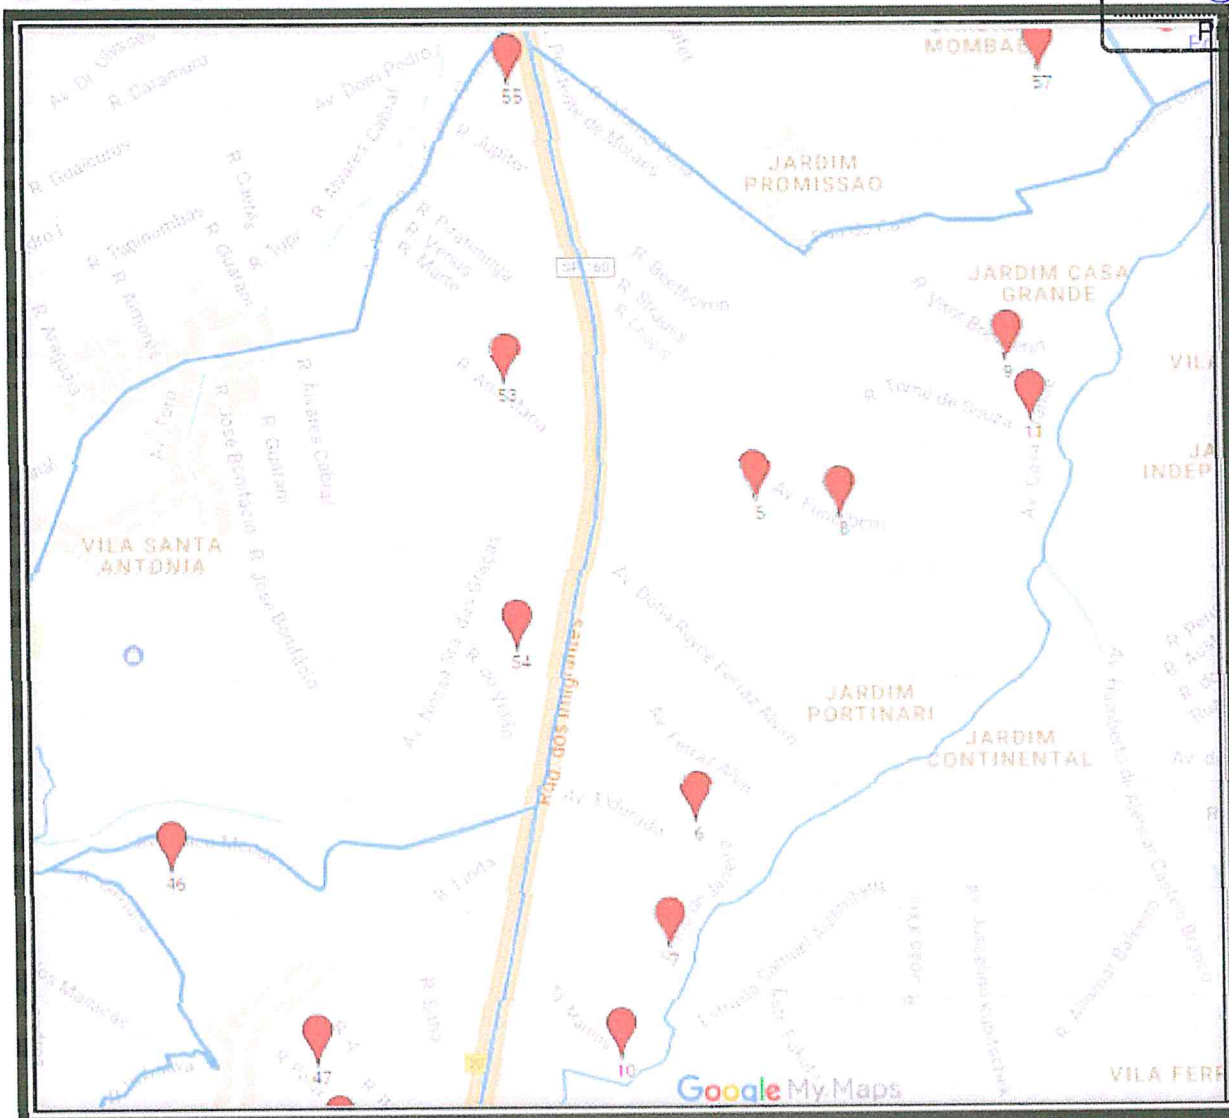

ID	OBRA	ENDEREÇO DE REFERÊNCIA	BAIRRO
5	CONSTRUÇÃO DA CRECHE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	AV. FUNDIBEM, 670	CASA GRANDE
6	REFORMA DA UBS JD. RUYCE	AV. EL DORADO, 817	CASA GRANDE
7	IMPLANTAÇÃO DE TRATAMENTO PREFERENCIAL PARA TRANSPORTE COLETIVO ENTRE AS RUAS RIO DE JANEIRO E AV. CASA GRANDE (PAC MOBILIDADE)	RUA RIO DE JANEIRO	CASA GRANDE
8	PROLONGAMENTO DA AV. FUNDIBEM (PAC MOBILIDADE)	AVENIDA FUNDIBEM	CASA GRANDE
9	LIGAÇÃO DA AV. CASA GRANDE COM AV. MARECHAL CASTELO BRANCO (PAC MOBILIDADE)	RUA MEM DE SÁ	CASA GRANDE
10	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL REGIONAL ENTRE SBC E DIADEMA (PAC MOBILIDADE)	RUA RIO DE JANEIRO, 900	CASA GRANDE
11	RECAPEAMENTO DE RUAS NOS BAIRRO CASA GRANDE	CASA GRANDE	CASA GRANDE
53	URBANIZAÇÃO COMPLEXO BEIRA RIO (ETAPA : CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO)	R. DO INVERNO, 65	SERRARIA
54	URBANIZAÇÃO COMPLEXO BEIRA RIO (ETAPA - INVERNO VERÃO)	R. DO INVERNO, 65	SERRARIA
55	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO NA AV. RUYCE FERRAZ ALVIM SOBRE ROD. IMIGRANTES (PAC MOBILIDADE)	AV. DONA RUYCE FERRAZ ALVIM, 900	SERRARIA
